



YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2025

1 -YTÜ DPAŞA YERLEŞKESİ LOJMANLARI SOĞUK SU TESİSATI BORULARI DEĞİŞİMİ İŞİ




İHALE BİLGİLERİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞ ME ORANI
	3.786.500,00	30.06.2025	90 gün	29.09.2025	% 100
Yüklenici : HARUN UÇAR					

2 -YTU DAVUTPAŞA KAMPUSÜ YEMEKHANE BİNASI DOĞALGAZ KAZANI YENİLEMESİ ve YEMEK ÜRETİM BÖLÜMÜ DOĞALGAZ HATLARI DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ



İHALE BİLGİLERİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
	2.350.000,00	09.09.2025	40 gün	20.10.2025	% 100
Yüklenici : ALTUN ISI- MUHAMEMMET ALTUN					

3 -YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ A, D VE E BLOK ISITMA SOĞUTMA TESİSAT BORULARI DEĞİŞİMİ

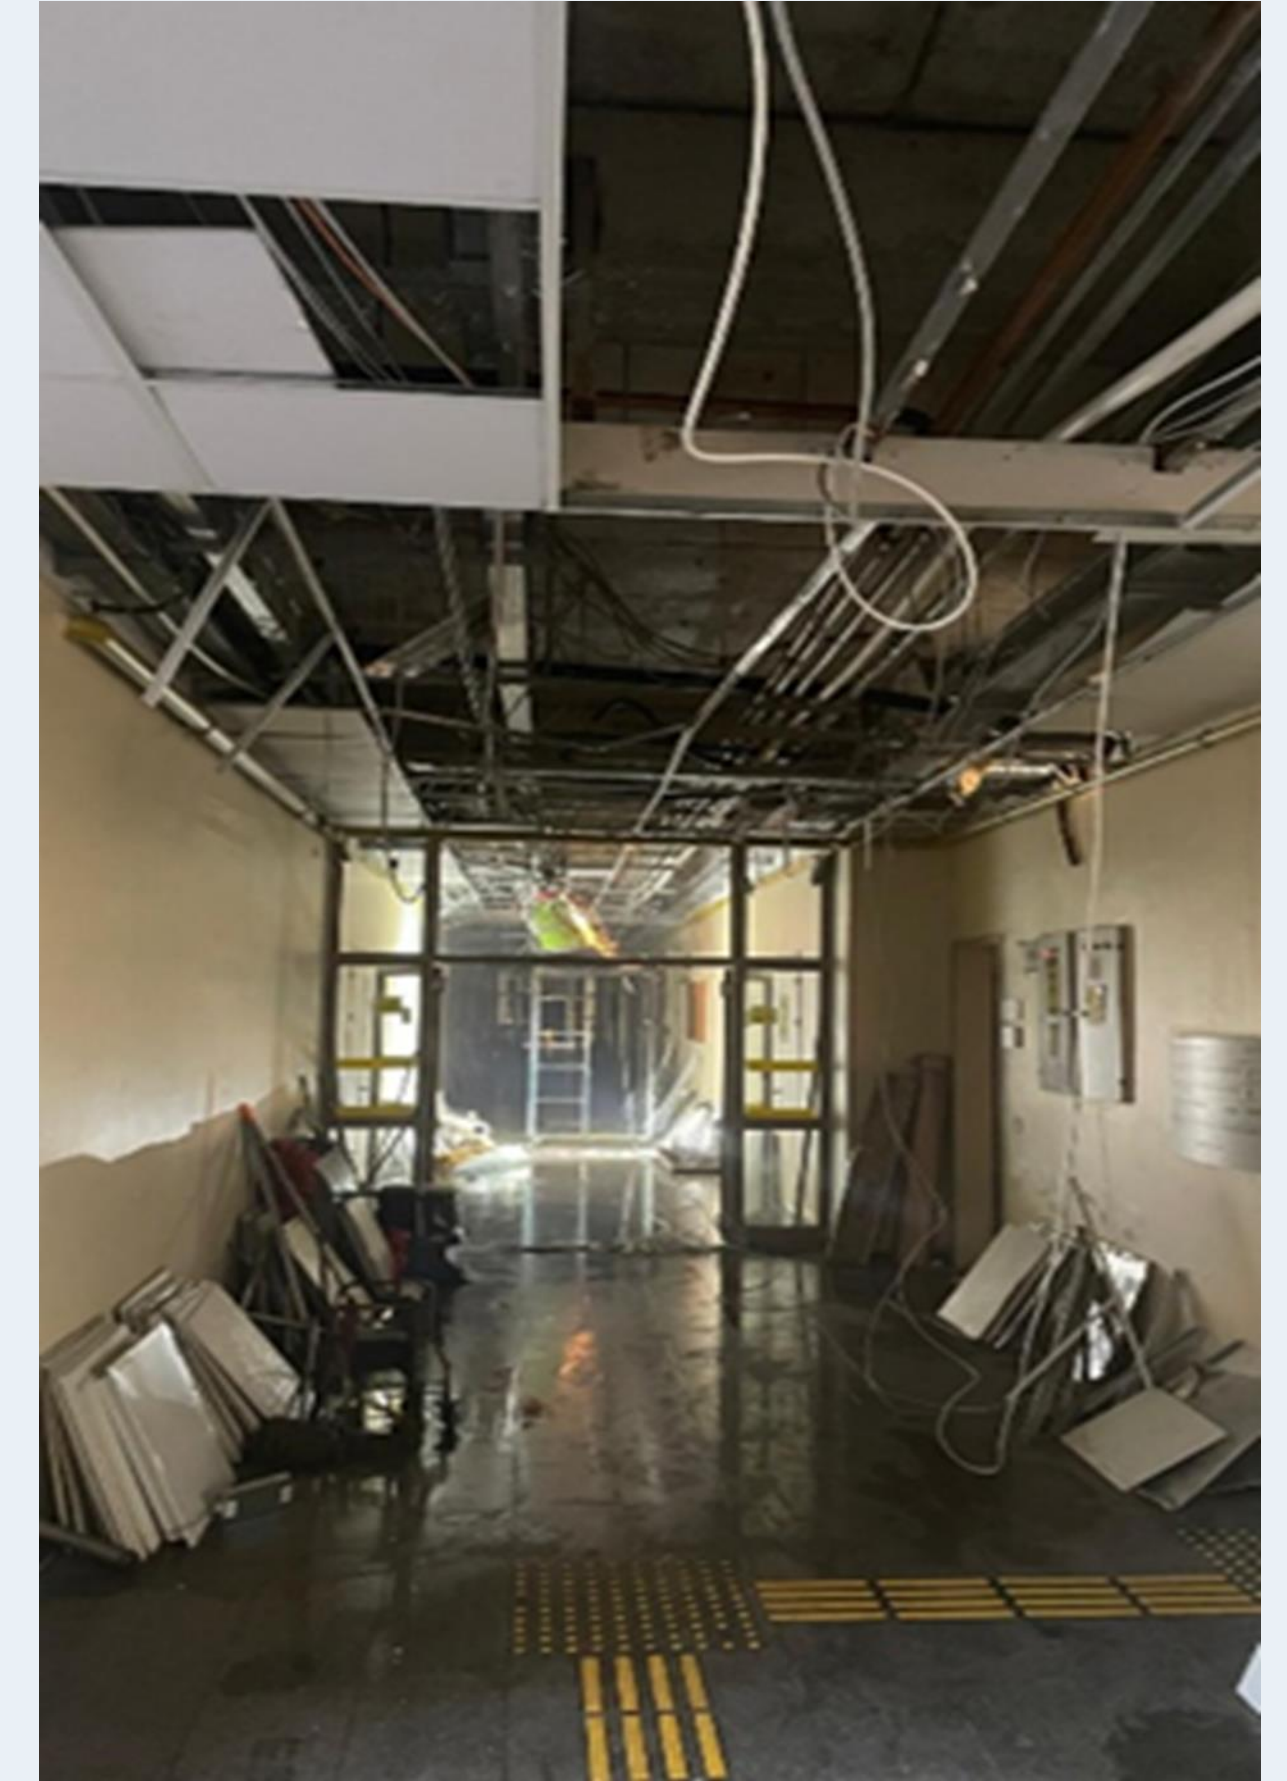

İHALE BİLGİLERİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
	6.695.000,00	06.10.2025	60 gün	06.12.2025	% 100
Yüklenici : SİNAN ÖKSÜZER					

4 -YTÜ BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TADİLAT İŞİ





İHALE BİLGİLERİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞ ME ORANI
	5.111.00,00 TL	02.10.2025	60 gün	01.12.2025	% 100
Yüklenici : SİNAN ÖKSÜZER					

5 - YTÜ BEŞİKTAŞ VE DAVUTPAŞA KAMPÜSLERİNDE YANGIN İHBAR SİSTEMİ ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ



İHALE BİLGİLERİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
	6.676.168,95	24.10.2025	120 gün	21.02.2026	% 50
Yüklenici : YİĞİT AĞA İNŞ. ELEKTR. NAKL. HAYV. TEM. HİZ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.					


6 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ LOJMANLARI TERAS YALITIM İŞİ

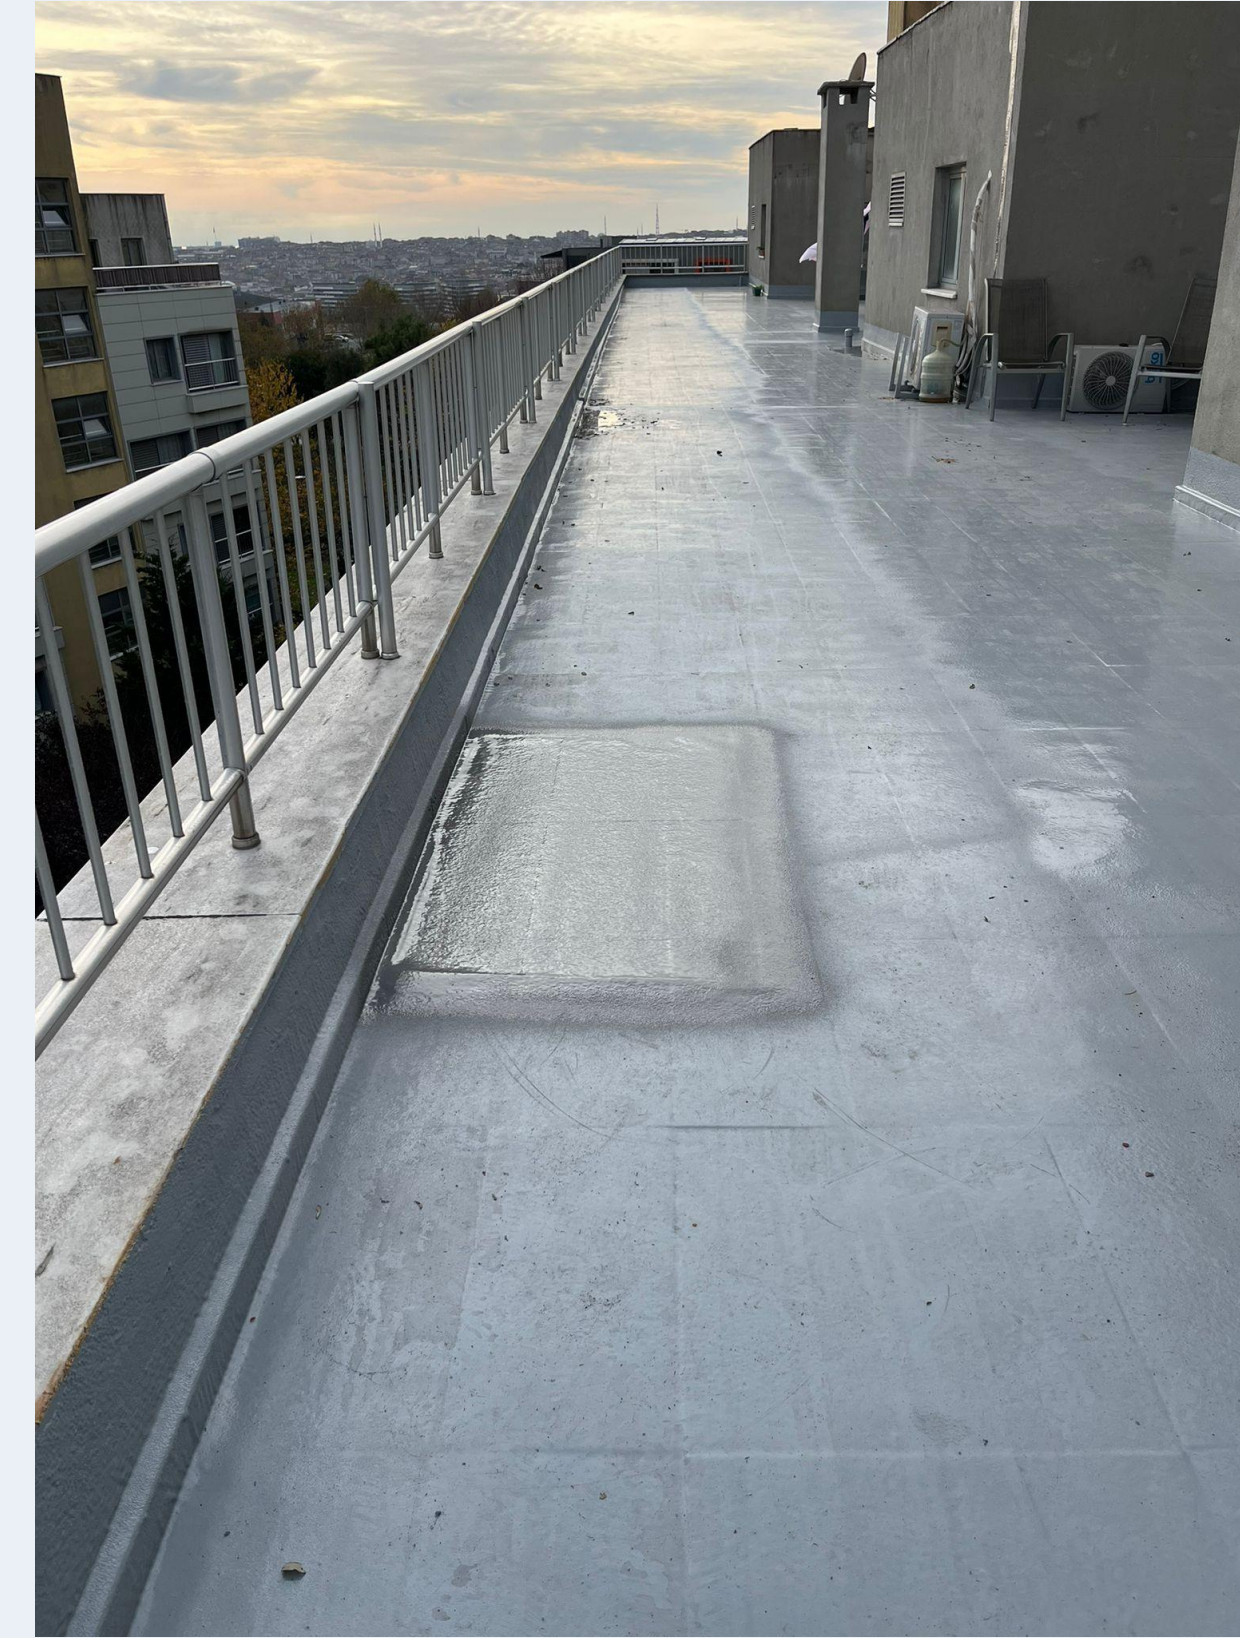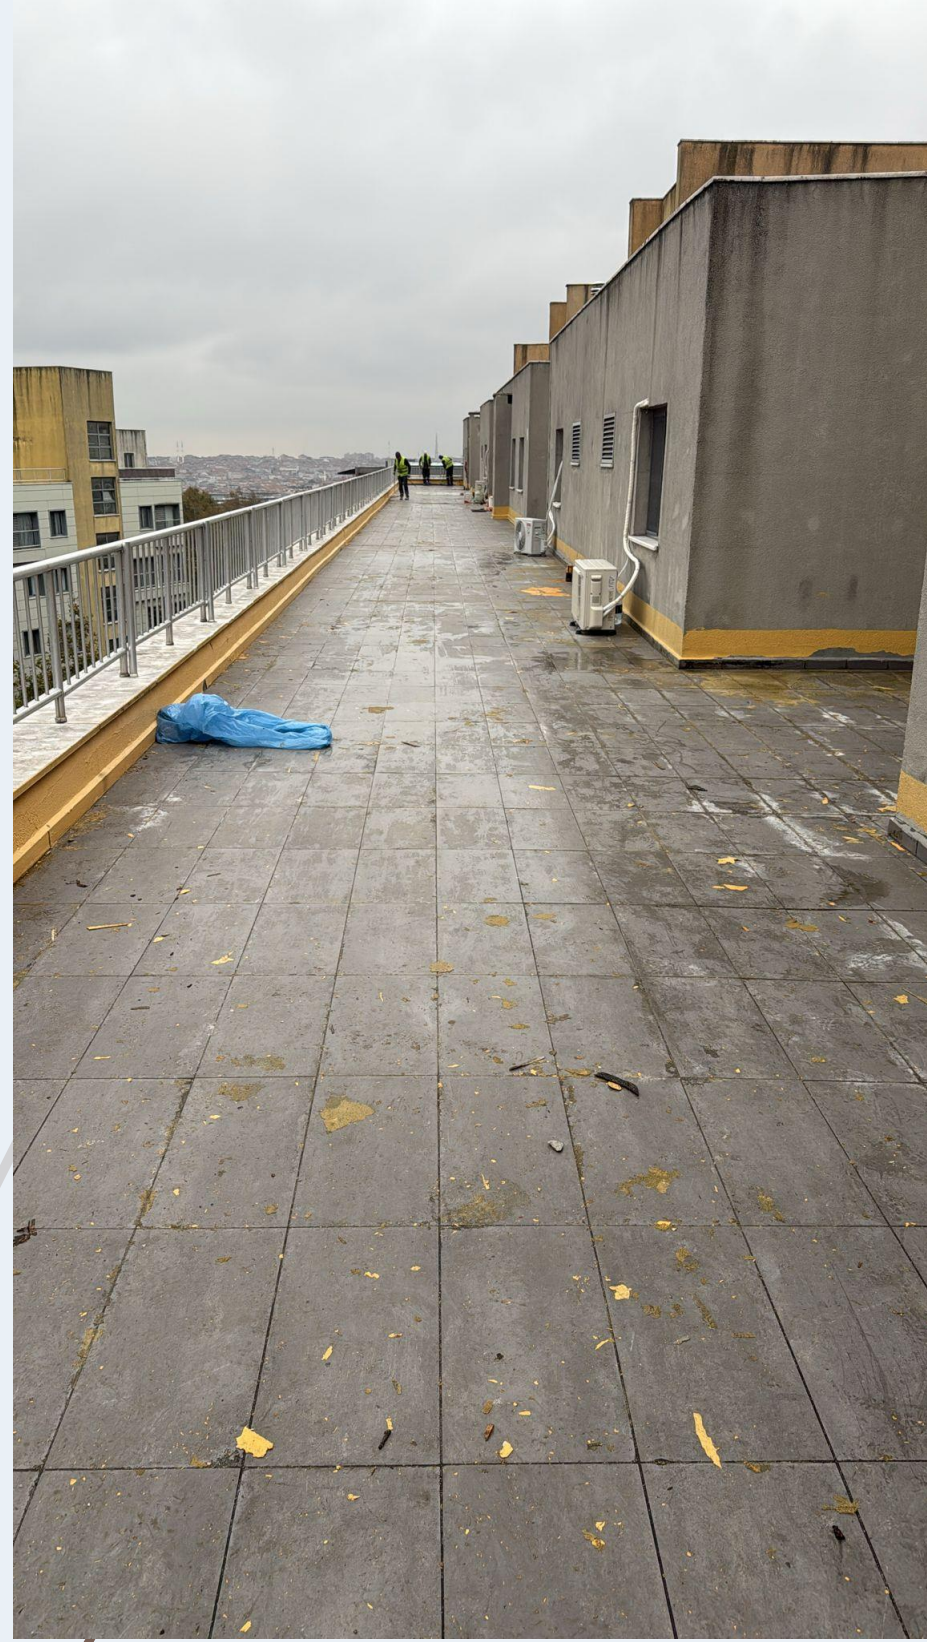

İHALE	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞ ME ORANI
	8.539.987	29.09.2025	45 gün	03.12.2025	% 100

Yüklenici : OĞUZ KAAN BEKTAŞ

7 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜNDE BULUNAN LOJMAN ASANSÖRLERİN MODERNİZASYON VE REVİZYON YAPIM İŞİ

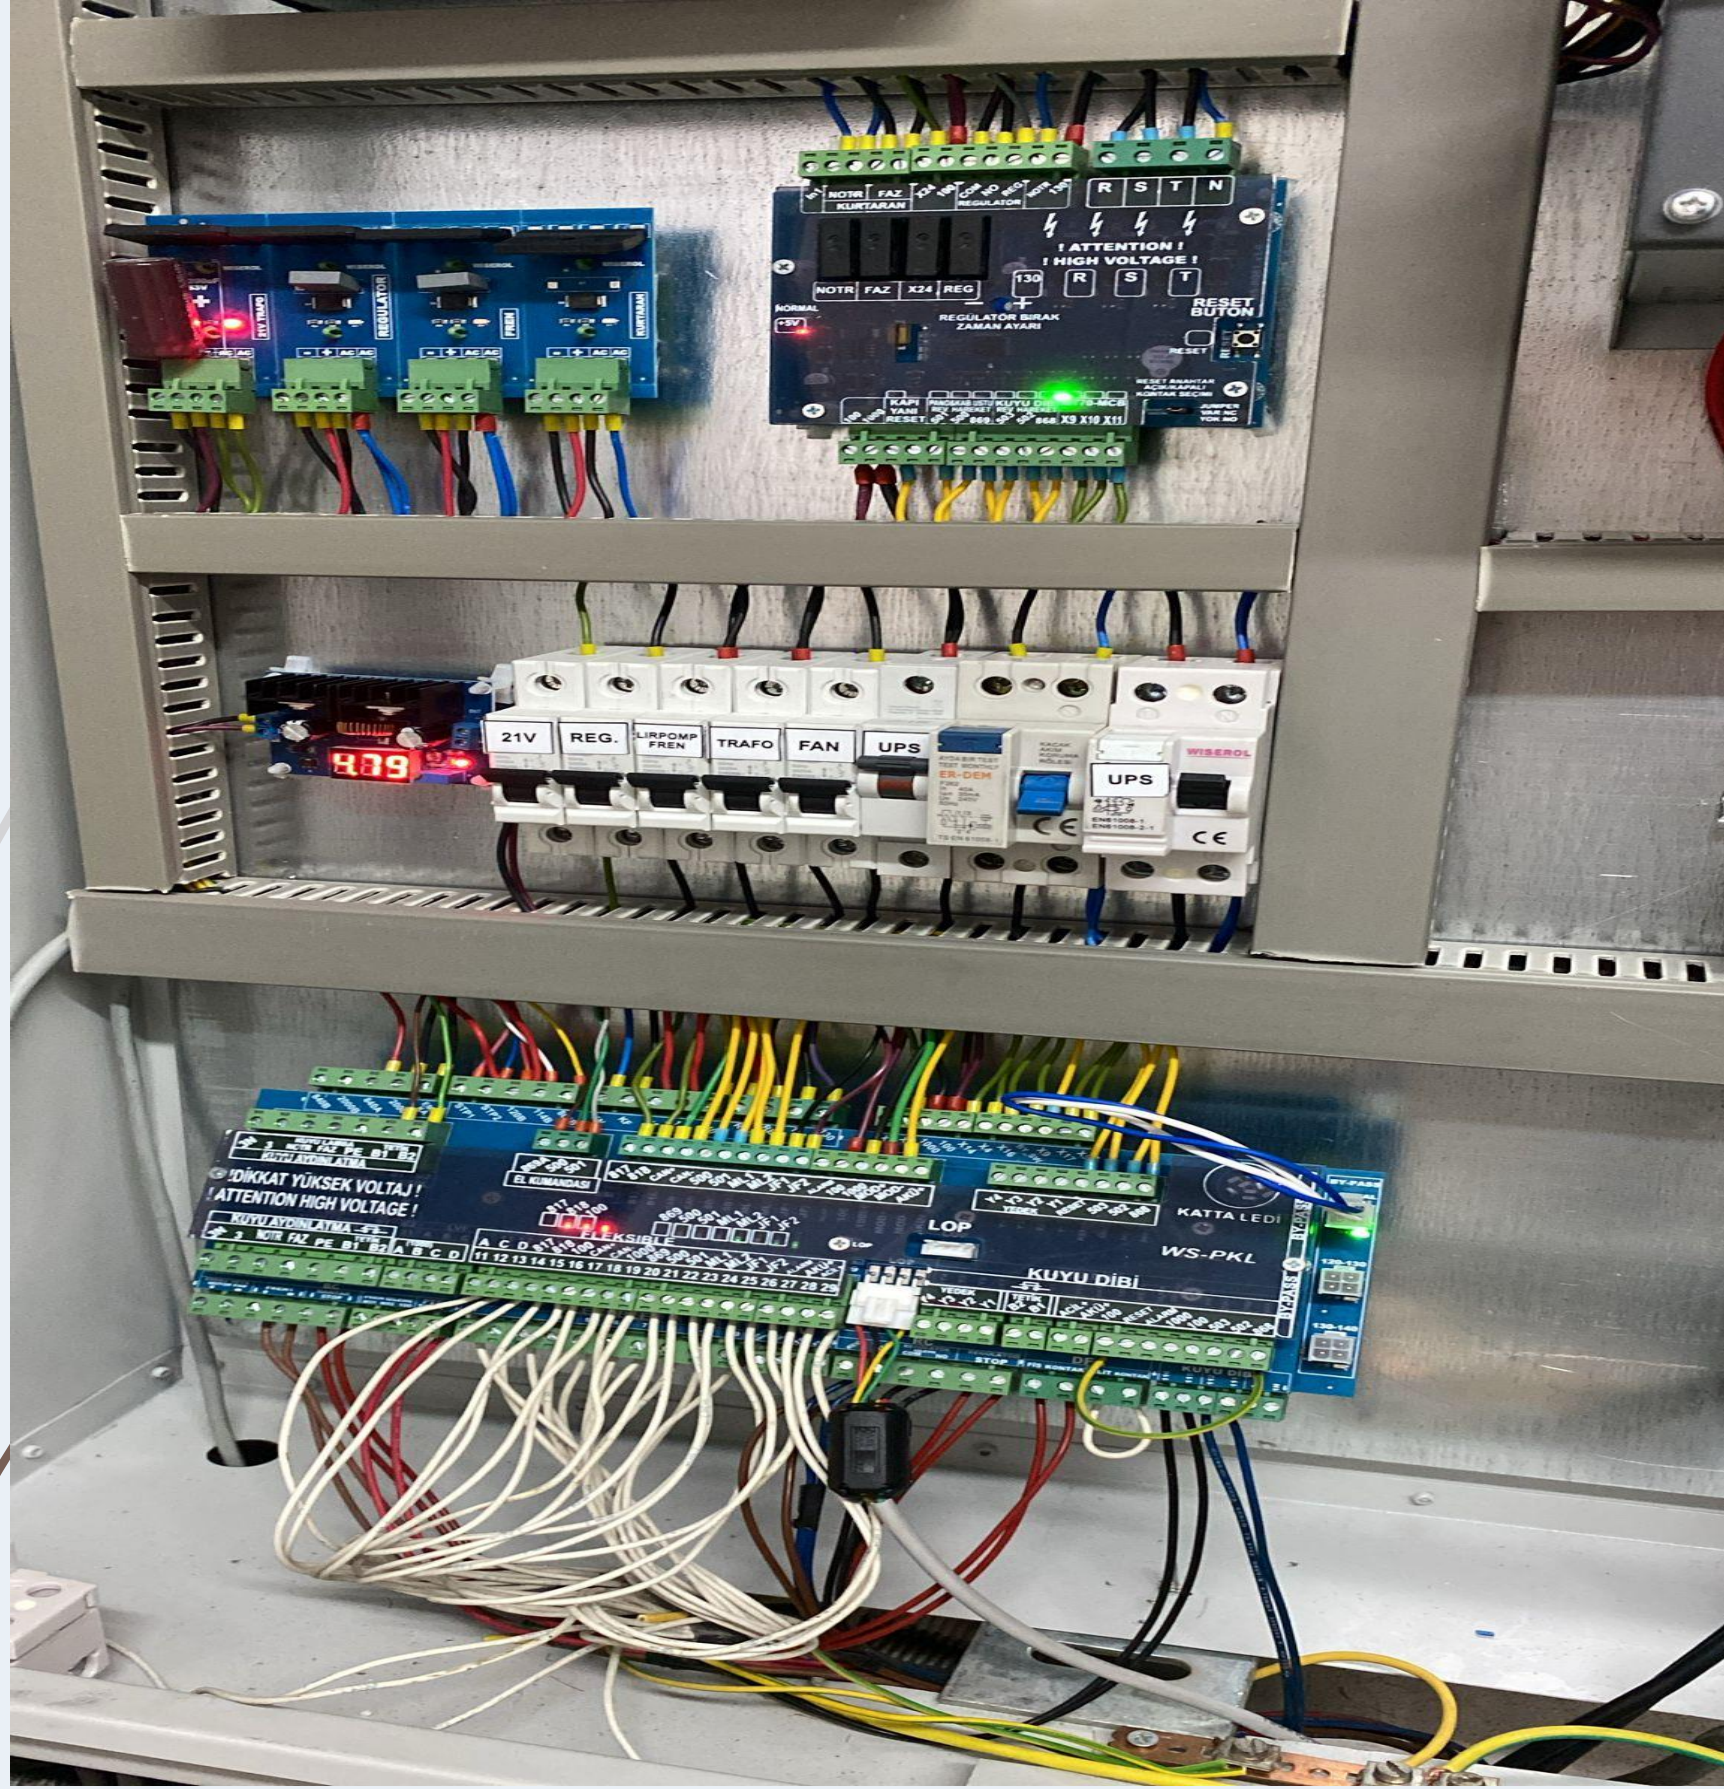

İHALE	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞ ME ORANI
	15.912.000,00	23.10.2025	100 gün	24.10.2026	% 95

YÜKLENİCİ : ZEM ASANSÖR İNŞAAT DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

8 -YTÜ İİBF ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TADİLAT İŞİ

İHALE	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞ ME ORANI
	4.188.000,00	05.01.2026	120 gün	2026	
MTH MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 2026 YILI İTİBARIYLA İMALATA BAŞLANACAKTIR.					

9 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYON İKMAL İNŞAATI



İHALE	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
	6.868.068,68	2026	90 gün	2026	
YÜKLENİCİ : MTH MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ –					
2026 YILI İTİBARIYLA İMALATA BAŞLANACAKTIR.					

9 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TÖMER TADİLAT YAPIM İŞİ

İHALE	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
		2026		2026	
YÜKLENİCİ : 2026 YILI İTİBARIYLA İMALATA BAŞLANACAKTIR.					

9 - YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TARİHİ 13 NOLU AHIR BİNASI RESTORASYONU İŞİ



İHALE	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
		2026		2026	
İKLENİCİ : 2026 YILI İTİBARIYLA İMALATA BAŞLANACAKTIR.					

DOĞRUDAN TEMİNLER

- YTÜ D.PAŞA KAMP. ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAK. İSG KAPSAMINDA FİLE YAPILMASI VE ACİL ÇIKIŞ DÜZENLEMELERİ İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. BATI DİLLERİ MUTFAK VE HİDROLİK LAB. ACİL ÇIKIŞ KAPILARI İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KAPALI YÜZME HAVUZU TADİLAT İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KİMYA METALURJİ FAK. ÇATI YALITIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP.ÇEVRE LAB. KOMPACT TEZGAH İŞİ
- YTÜ İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LAB. ONARIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KAPALI YÜZME HAVUZU SERAMİK DERZLERİ YENİLEME İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR LAB YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. MUHTELİF YERLERDE LAB. VE MUTFAK DOLABI YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. FEN EDEB .B-D-E BLOKLARI ÇATI TADİLAT VE YALITIM İŞLERİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. ÇEVRE AYDINLATMA ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP.İLHAN VARANK KÜTÜPHANESİ BİNASI TADİLAT İŞİ

DOĞRUDAN TEMİNLER

- YTÜ D.PAŞA KAMP.EĞİTİM FAK ÇALIŞMA SALONU TADİLATI İŞİ
- YTÜ BEŞİKTAŞ KAMP. E3 BLOK DUVAR BÖLME YAPILMASI İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ BODRUM KAT DEPO YAPILMASI İŞİ
- YTÜ BEŞİKTAŞ KAMP GEMİ İNŞ FAK TAD.VE HAVALANDIRMA İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KONSOL TİP BETONARME İSTİNAT DUVARI
- YTÜ BEŞİKTAŞ KAMP. MİMARLIK FAK. B-D GEÇİŞ BLOKLARI VE D-406 NOLU ODADA ELEKTRİK İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KIŞLA BİNASI PAYANDA ,TEMEL BOYUTLANDIRMA VE YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. ASANSÖRLERDE VE ÇEŞİTLİ MAHALLERDE İZOLASYON İŞİ
- KIŞLA BİNASI ZEMİN ETÜTÜ TEKNİK RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ALTYAPI DÜZENLEMESİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. B KAPISI UYGULAMA PROJELERİ HİZMET ALIM İŞİ



➤ **1- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ**

➤ **İDARİ BİNA**

➤ **TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ :** **100.000.000,00 TL**

➤ **AKTARMA** **35.160.000,00 TL**

➤ **KALAN :** **64.840.000,00 TL**

➤ **2- BÜYÜK ONARIMLAR PROJESİ**



➤ **TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ :** **103.000.000,00 TL**

➤ **DÖNEM BAŞI GELEN ÖDENEK** **100.000.000,00 TL**



➤ **HARCAMA** **60.788.090,65 TL**

➤ **KALAN :** **42.160.000,00 TL**

➤ **3- KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ**

➤ **DÖNEM BAŞI ÖDENEĞİ** **40.000.000,00 TL**

➤ **AKTARMA SONRASI KALAN ÖDENEK** **15.000.000,00 TL**

➤ **HARCAMA** **1.744.718,83 TL**

➤ **KALAN :** **13.255.281,17 TL**



➤ 4 - ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ 2022H03-186817	
➤ DÖNEM BAŞI ÖDENEĞİ	500.000,00 TL
➤ AKTARMA SONRASI BÜTÇE	7.500.000,00 TL
➤	
➤ HARCAMA	1.024.800,00 TL
➤ KALAN :	6.475.200,00 TL

➤ **5 - YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TARİHİ BÖLÜK BİNASI
RESTORASYON YAPIM İŞİ**

➤ **DÖNEM BAŞI ÖDENEĞİ** **8.000.000,00 TL**

➤

➤ **HARCAMA** **-**

➤ **KALAN :** **8.000.000,00 TL**

➤ **5 - YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TARİHİ 13 NOLU AHIR BİNASI**

RESTORASYON YAPIM İŞİ

➤ **DÖNEM BAŞI ÖDENEĞİ** **10.000.000,00 TL**



➤ **HARCAMA** **-**

➤ **KALAN :** **10.000.000,00 TL**
